



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 17 del 25 GEN. 2011

**Oggetto** Intesa Istituzionale di programma – 3° protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità in Campania"..  
**Lavori di Adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 – Vitulanese I° Tronco – " Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)", Cod. VR. BN 07**  
**Presenza d'atto proposta del Comune di Ponte della variante allo svincolo "ex SS 372-variante abitato di Ponte" ed approvazione variante tecnica.**

L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di gennaio  
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	<b>Aniello</b>	<b>CIMITILE</b>	- Presidente	_____
2) Avv.	<b>Antonio</b>	<b>BARBIERI</b>	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	<b>Gianluca</b>	<b>ACETO</b>	- Assessore	_____
4) Ing.	<b>Giovanni Vito</b>	<b>BELLO</b>	- Assessore	_____
5) Avv.	<b>Giovanni A.M.</b>	<b>BOZZI</b>	- Assessore	ASSENTE
6) Ing.	<b>Carlo</b>	<b>FALATO</b>	- Assessore	_____
7) Dr.ssa	<b>Annachiara</b>	<b>PALMIERI</b>	- Assessore	_____
8) Dott.	<b>Nunzio</b>	<b>PACIFICO</b>	- Assessore	ASSENTE
9) Geom.	<b>Carmine</b>	<b>VALENTINO</b>	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

VISTO il rapporto del S.I.V. prot. n. 317 del 13.01.2011 del seguente tenore:

## **"PREMESSO CHE:**

- Con delibera di G.P. n°368 del 22/06/2007 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo del seguente intervento: "Lavori di Adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 – Vitulanese I° Tronco – " Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)" Cod. VR. BN 07 a finanziarsi ai sensi dell'Intesa Istituzionale di Programma con la Regione Campania, per l'importo complessivo di €. 2.100.000,00;
- Con determina dirigenziale n°962/06 del 12.10.2007 venivano aggiudicati, a seguito di asta pubblica, i lavori de quo alla ditta Acquaviva s.r.l. sede in Via Portanuova n° 3 – Acquaviva di Isernia (IS), per l'importo di € 953.203,23 al netto del ribasso offerto del 32,70%, comprensivo di oneri della sicurezza pari a €.17.131,88, oltre alle somme a disposizione pari a €. 934.361,85, determinandosi un importo complessivo definitivo di finanziamento pari a €. 1.904.696,97;

- in data 13.03.2008 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n°164 registrato in Benevento al Rep. 594 mod.1 del 28.03.2008;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 13.03.2008 e in via definitiva in data 10.07.2009;
- i lavori sono in corso di ultimazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- più volte l'Amministrazione comunale di Ponte ha evidenziato alla Direzione dei lavori problematiche che si potrebbero verificare nell'area dello svincolo della "variante all'abitato di Ponte" sulla ex SS 372 per la presenza del Cimitero comunale;
- difatti il progetto, a base di gara ed affidato alla ditta appaltatrice, prevede che la corsia di marcia della ex SS 372, direzione Ponte-Telese, sia rasente l'ingresso cimiteriale e quindi non sicura per i visitatori;
- sulla base di dette considerazioni, con nota prot. n°5554 del 11/11/2010, il Sindaco del Comune di Ponte ha trasmesso la planimetria riportante una modifica alla soluzione progettuale attualmente vigente prevedendo:

*l' allontanamento della corsia di marcia della ex SS 372, direzione Ponte-Telese, dall'ingresso del cimitero;  
il conseguente rimpicciolimento delle aiuole spartitraffico;  
un'area di circa mq 400 a servizio del cimitero*

**EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE:**

- per la soluzione proposta è stata redatta dal D.L. apposita variante tecnica che non ha portato ad aumento delle somme già determinate e di cui all'atto dirigenziale n° 658/06 del 21/07/2009;
- l'impresa esecutrice dei lavori ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori di variante rispetto a quelli affidati con determina dirigenziale n°658/06 del 21/07/2009;

**Per quanto sopra premesso e considerato con il presente rapporto tecnico si propone di:**

1. **prendere atto** della proposta prot. n°5554 del 11/11/2010 del Comune di Ponte;
2. **approvare** la variante tecnica della perizia dei "Lavori di piantumazione e opere a verde" dei "Lavori di adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 - Vitulanese I° Tronco - " Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)". Cod. VR. BN 0;
3. **dare atto** che non si ha maggiore spesa dei lavori appaltati.";

**RITENUTO doversi provvedere nel merito;**

**VISTO** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;



*Provincia di Benevento*  
*Settore Infrastrutture e Viabilità*

Servizio Viabilità 2

Prot. n° 314 /SI del 13 GEN. 2011

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP.  
SEDE

**OGGETTO:** Intesa Istituzionale di programma – 3° protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità in Campania"..

*Lavori di Adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 – Vitulanese 1° Tronco – " Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)". Cod. VR. BN 07*

**Presenza d'atto proposta del Comune di Ponte della variante allo svincolo "ex SS 372-variante abitato di Ponte" ed approvazione variante tecnica.**

**PREMESSO CHE:**

- Con delibera di G.P. n°368 del 22/06/2007 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo del seguente intervento: "Lavori di Adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 – Vitulanese 1° Tronco – " Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)" Cod. VR. BN 07 a finanziarsi ai sensi dell'Intesa Istituzionale di Programma con la Regione Campania, per l'importo complessivo di €. 2.100.000,00;
- Con determina dirigenziale n°962/06 del 12.10.2007 venivano aggiudicati, a seguito di asta pubblica, i lavori de quo alla ditta Acquaviva s.r.l. sede in Via Portanuova n° 3 – Acquaviva di Isernia (IS), per l'importo di € 953.203,23 al netto del ribasso offerto del 32,70%, comprensivo di oneri della sicurezza pari a €.17.131,88, oltre alle somme a disposizione pari a €. 934.361,85, determinandosi un importo complessivo definitivo di finanziamento pari a €. 1.904.696,97;
- in data 13.03.2008 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n°164 registrato in Benevento al Rep. 594 mod.1 del 28.03.2008;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 13.03.2008 e in via definitiva in data 10.07.2009;
- i lavori sono in corso di ultimazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- più volte l'Amministrazione comunale di Ponte ha evidenziato alla Direzione dei lavori problematiche che si potrebbero verificare nell'area dello svincolo della "variante all'abitato di Ponte" sulla ex SS 372 per la presenza del Cimitero comunale;
- difatti il progetto, a base di gara ed affidato alla ditta appaltatrice, prevede che la corsia di marcia della ex SS 372, direzione Ponte-Telese, sia rasente l'ingresso cimiteriale e quindi non sicura per i visitatori;
- sulla base di dette considerazioni, con nota prot. n°5554 del 11/11/2010, il Sindaco del Comune di Ponte ha trasmesso la planimetria riportante una modifica alla soluzione progettuale attualmente vigente prevedendo:

*l' allontanamento della corsia di marcia della ex SS 372, direzione Ponte-Telese, dall'ingresso del cimitero;  
il conseguente rimpicciolimento delle aiuole spartitraffico;  
un'area di circa mq 400 a servizio del cimitero*

**EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE:**

- per la soluzione proposta è stata redatta dal D.L. apposita variante tecnica che non ha portato ad aumento delle somme già determinate e di cui all'atto dirigenziale n° 658/06 del 21/07/2009;
- l'impresa esecutrice dei lavori ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori di variante rispetto a quelli affidati con determina dirigenziale n°658/06 del 21/07/2009;

Per quanto sopra premesso e considerato con il presente rapporto tecnico si propone di:

1. prendere atto della proposta prot. n°5554 del 11/11/2010 del Comune di Ponte;
2. approvare la variata tecnica della perizia dei "Lavori di piantumazione e opere a verde" dei "Lavori di adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 - Vitulanese 1° Tronco - " Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)". Cod. VR. BN 0;
3. dare atto che non si ha maggiore spesa dei lavori appaltati.

La Responsabile del servizio Viabilità 2 - DL

(ing. *Stefania RISPOLI*)

Il Responsabile del Procedimento

(ing. *Francesco CARUSO*)



LA DIRIGENTE S.I.

(ing. *Liliana MONACO*)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
12 NOV 2010

**COMUNE DI PONTE**  
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

(Piazza XXII Giugno -82030 PONTE – TEL.0824/874114 – FAX 0824/874941-C.F.80000630626)

Prot. 5554 – 11.11.2010

 **Provincia di Benevento**  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0030801 Data 15/11/2010  
Oggetto INTERSEZIONE PONTE SUL  
FIUME CALORE CON EX S.S.  
Dest. Infrastrutture Settore

Amministrazione Provinciale di Benevento  
**SETTORE INFRASTRUTTURE E VIABILITA'**  
Via Calandra  
**82100 BENEVENTO**

Oggetto: Intersezione ponte sul fiume Calore con ex S.S. 372 e ingresso cimitero comunale.

AAAAAA


Facendo seguito ai precedenti incontri e sopralluoghi per individuare una migliore soluzione dell'intersezione del ponte in oggetto, si trasmette in allegato la planimetria relativa alla variante proposta dall'Amministrazione comunale.

SETTORE INFRASTRUTTURE

PROV. N. 18762

DEL 17 NOV. 2010

IL SINDACO  
( dott. Domenico Rosario Gennaro VENTUCCI)

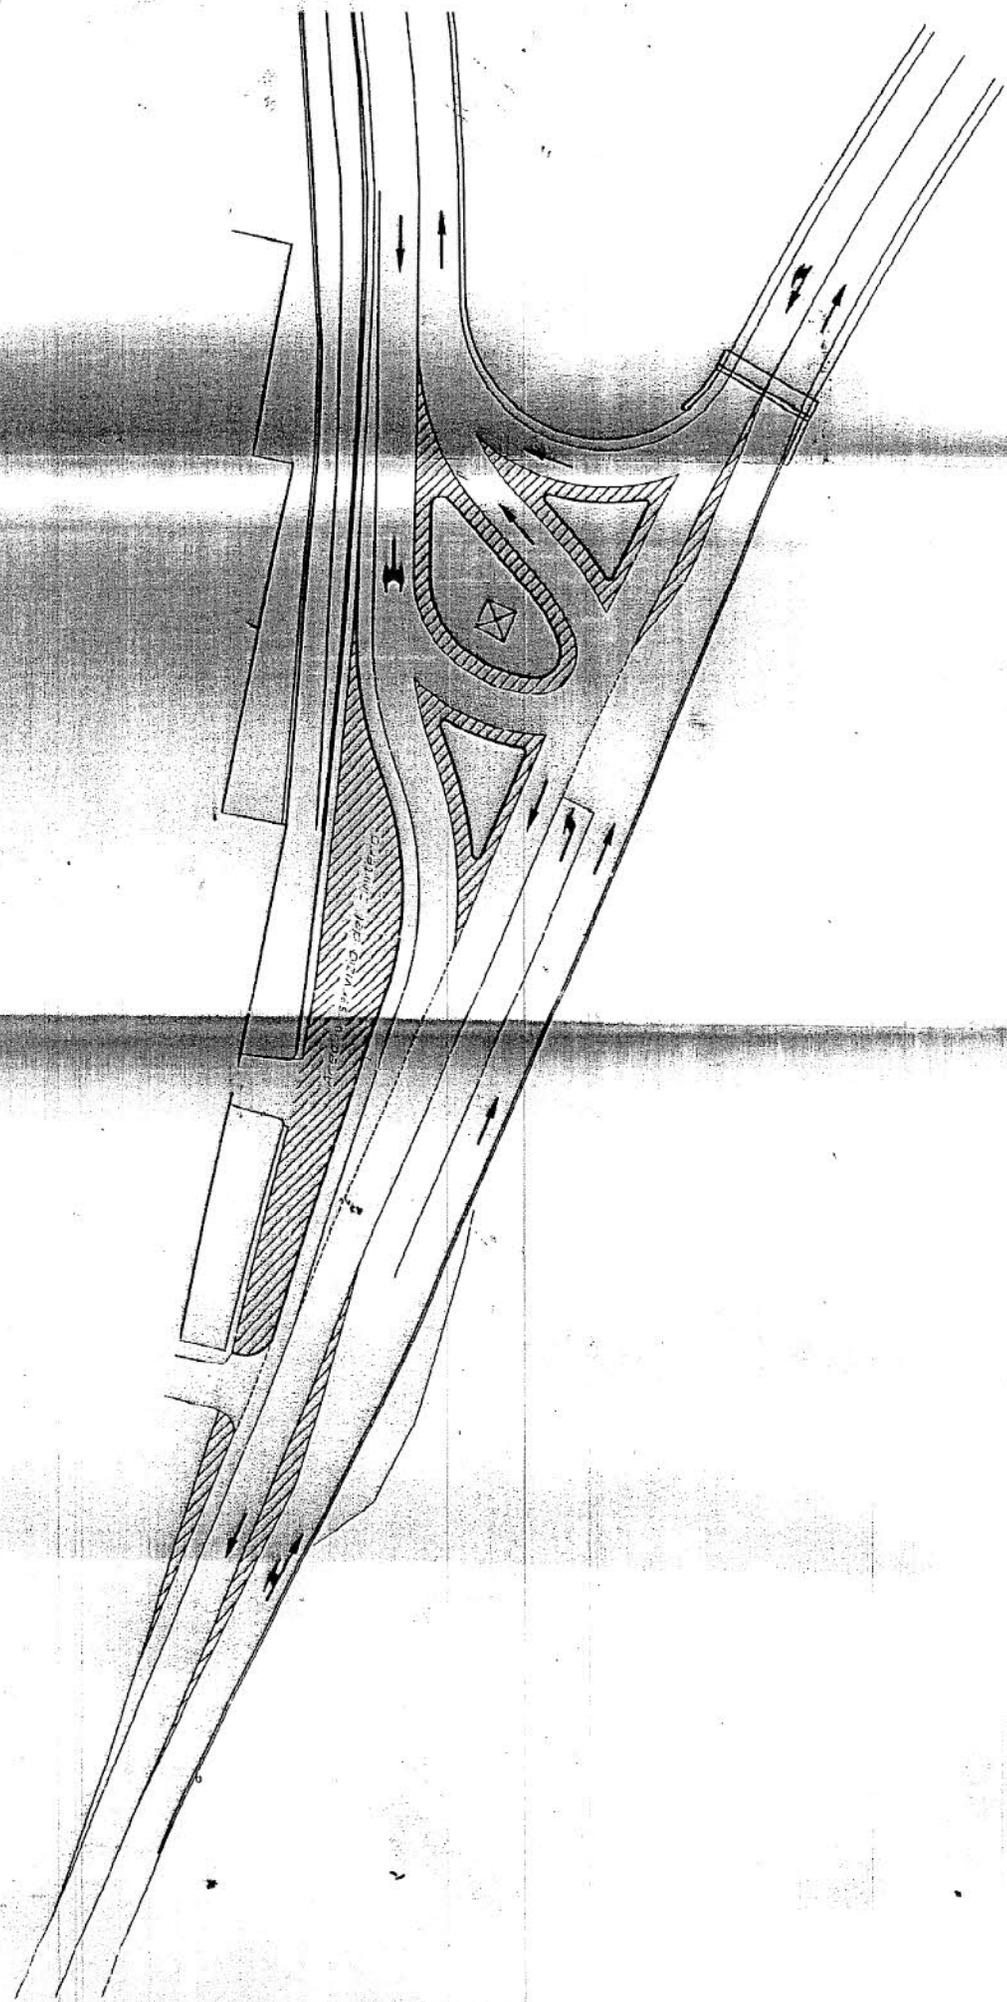



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**Settore Infrastrutture e Viabilità**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE**  
**SS.PP. EX 372 - VITULANESE I° TRONCO**  
**"VARIANTE S.P. EX 372 (ABITATO DI PONTE)"**

**PERIZIA "LAVORI DI PIANTUMAZIONE E OPERE A VERDE"**  
**ASSESTAMENTO CONTABILE**

TAVOLA N°	TITOLO:	DATA:
<b>A</b>	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	SCALA 1:

DIREZIONE LAVORI  
(dott. ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Liliana Monaco)

IL R.U.P.  
(dott. ing. Francesco Caruso)

L'IMPRESA  
La.Bit. s.r.l.



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'420,14
5 U02.002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Per realizzazione blocco palo Per realizzazione cavidotto	4,00	1,00	1,000	1,000	4,000		
			9,20	0,600	0,800	4,416		
			21,50	0,600	0,800	10,320		
			24,70	0,600	0,800	11,856		
			26,10	0,600	0,800	12,528		
			10,00	0,600	0,800	4,800		
	SOMMANO m³					47,920	2,88	138,01
7 U02.009a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 6 [m³ 47,920]					47,920		
	SOMMANO m³					47,920	5,23	250,62
8 U02.011a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... tuali additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mm² Per blocco pali	4,00	1,00	1,000	1,000	4,000		
	SOMMANO m³					4,000	80,66	322,64
9 L02.082e	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... rte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio posa di un solo tubo in sito di posa diametro mm 90 Per collegamento nuovi pali con esistenti		9,20			9,200		
			21,50			21,500		
			24,70			24,700		
			26,10			26,100		
			10,00			10,000		
	SOMMANO m					91,500	4,15	379,73
10 L02.017e	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... -22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TETRAPOLARE sezione 4x10 mm² Per collegamento nuovi pali con esistenti		9,20			9,200		
			21,50			21,500		
			24,70			24,700		
			26,10			26,100		
			10,00			10,000		
	SOMMANO m					91,500	4,27	390,71
11 L02.016a	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 0-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TRIPOLARE sezione 3x1.5 mm²	4,00	8,00			32,000		
	A RIPORTARE					32,000		16'901,85









**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**Settore Infrastrutture e Viabilità**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE**  
**SS.PP. EX 372 - VITULANESE I° TRONCO**  
**"VARIANTE S.P. EX 372 (ABITATO DI PONTE)"**

**PERIZIA "LAVORI DI PIANTUMAZIONE E OPERE A VERDE"**  
**ASSESTAMENTO CONTABILE**

TAVOLA N°	TITOLO:	DATA:
<b>B</b>	QUADRO DI RAFFRONTO	SCALA 1:

DIREZIONE LAVORI  
(dott. ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Liliana Monaco)

IL R.U.P.  
(dott. ing. Francesco Caruso)

L'IMPRESA  
La.Bit. s.r.l.

## PROVINCIA DI BENEVENTO

### LAVORI DI PIANTUMAZIONE E OPERE A VERDE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. EX 372 - VITULANESE 1° TRONCO "VARIANTE S.P. EX 372 (ABITATO DI PONTE)"

#### QUADRO COMPARATIVO

N.	Art.	Descrizione	u.m.	Prezzo	PROGETTO		ASSESTAMENTO		SCOSTAMENTI	
					Quantità	Importo	Quantità	Importo	In più	In meno
1	E.07.009A	Esecuzione di drenaggio orizzontale	mc	€ 40,86	150,946	€ 6 167,65	36,800	€ 1 503,65		-€ 4 664,01
2	L02.016a	Cavo di corda rigida 3x1,5 mmq	m	€ 1,30	32,000	€ 41,60	32,000	€ 41,60	€ -	€ -
3	L02.017e	Cavo di corda rigida 4x10 mmq	m	€ 4,27	120,000	€ 512,40	91,500	€ 390,71		-€ 121,70
4	L02.082e	Cavidotto flessibile corrugato mm 90	m	€ 4,15	120,000	€ 498,00	205,800	€ 854,07	€ 356,07	
5	L05.001d	Corda di rame nudo 35 mmq	m	€ 4,40	120,000	€ 528,00	91,500	€ 402,60		-€ 125,40
6	L05.013d	Dispersore a croce	cad	€ 66,56	4,000	€ 266,24	4,000	€ 266,24	€ -	€ -
7	U01.027b	Pozzetto di raccordo 50x50x50	cad	€ 53,22	4,000	€ 212,88	7,000	€ 372,54	€ 159,66	
8	U01.039a	Chiusino 500x500 mm	cad	€ 161,14	4,000	€ 644,56	0,000	€ -		-€ 644,56
9	U02.002a	Scavo a sezione obbligata, fino a 2 mt.	mc	€ 2,88	89,050	€ 256,46	116,934	€ 336,77	€ 80,31	
10	U02.009a	Trasporto a rifiuto	mc	€ 5,23	89,050	€ 465,73	116,934	€ 611,56	€ 145,83	
11	U02.011a	RbK=250 in fondazione	mc	€ 80,66	4,000	€ 322,64	48,037	€ 3 874,66	€ 3 552,02	
12	U02.034	Strato di usura (Tappetino)	m <sup>2</sup> /cm	€ 1,30	6654,150	€ 8 650,40	6596,100	€ 8 574,93		-€ 75,47
13	U02.055a	Cordoli cls	m	€ 24,84	305,170	€ 7 580,42	208,900	€ 5 189,08		-€ 2 391,35
14	U05.007a	Lampade a vapore di sodio 150 W	cad	€ 27,90	4,000	€ 111,60	10,000	€ 279,00	€ 167,40	
15	U05.012d	Reattori per lampade a150 W	cad	€ 50,54	4,000	€ 202,16	10,000	€ 505,40	€ 303,24	
16	U05.035b	Apparecchio carenato per lampada 150 W	cad	€ 257,40	4,000	€ 1 029,60	10,000	€ 2 574,00	€ 1 544,40	
17	U05.045c	Palo in acciaio H=10,2 mt fuori terra	cad	€ 856,84	2,000	€ 1 713,68	4,000	€ 3 427,36	€ 1 713,68	
<b>Sommano</b>						€ 29 204,03		€ 29 204,17	€ 8 022,61	-€ 8 022,47

Si riduce all'importo contrattuale di € 29.204,03

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**(ing. Liliana MONACO)**

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**GESTIONE ECONOMICA**  
**(Dr.ssa Filomena LAZAZZERA)**

**LA GIUNTA**

Su parere favorevole dell'Assessore relatore Barbieri, ed unanimemente,

**DELIBERA**

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di prendere atto** della proposta prot. n°5554 del 11/11/2010 del Comune di Ponte;
- **di approvare** la variante tecnica della perizia dei "Lavori di piantumazione e opere a verde" dei "Lavori di adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 - Vitulanese I° Tronco - " Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)". Cod. VR. BN 0;
- **di dare atto** che non si ha maggiore spesa dei lavori appaltati;
- **di demandare** al Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità l'adozione dei consequenziali adempimenti;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(D. Claudio UCCELLI)

*Claudio Uccelli*

**IL PRESIDENTE**

(Prof. Ing. Anello CIMITILE)

*Anello Cimitile*

N. 34

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

**BENEVENTO** 01 FEB. 2011

**IL MESSO**

*[Signature]*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(D. Claudio UCCELLI)

*[Signature]*

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 01 FEB. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

Copia per

SETTORE Infrastrutture e Mobilità prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenza dei Capigruppo il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
