




PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA TECNICA

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

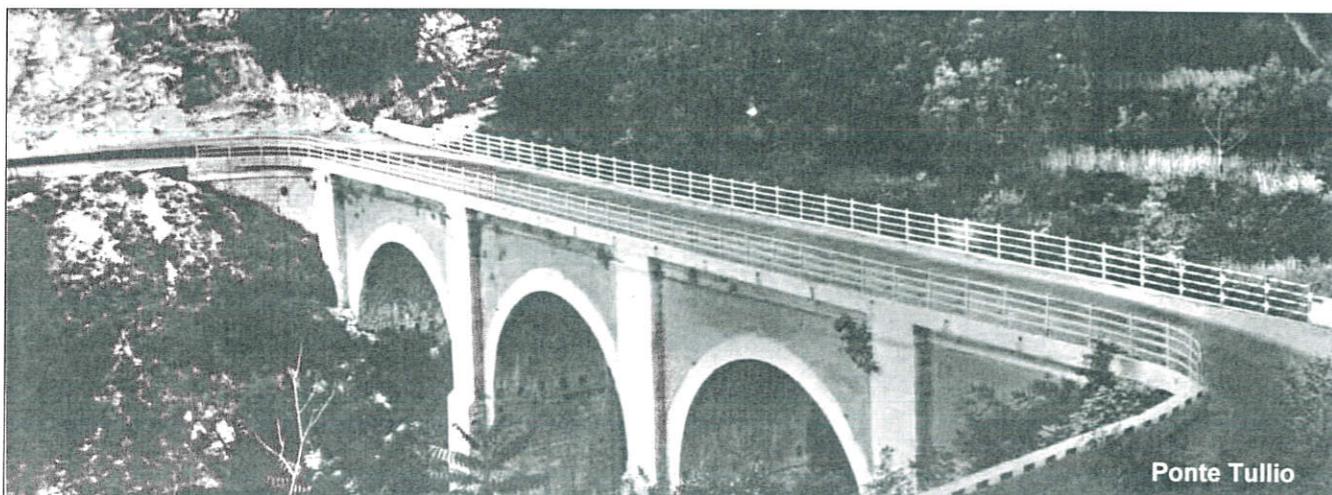

Ponte Tullio

PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, LETT. VVV) DEL D.lgs. N° 50/2016 RELATIVI A PONTI, VIADOTTI ESISTENTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 54, D.lgs. N° 50/2016.

PROGETTO TECNICO

**SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO -
SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI - SCHEMA ORDINE
DI LAVORO: NOTA TIPO N.1; N.2; N.3**

Tavola

R6

scala:

ELABORATO DA:

ing. Salvatore Minicozzi *Responsabile Servizio Viabilità*

arch. Giancarlo Marcarelli *Funzionario*

ing. Irene Ciardiello *Funzionario*

ing. Angelo Carmine Giordano *Rup - Dirigente*



Supporto Tecnico




Sannio Europa S.c.r.l.
Area Pianificazione Territoriale

geom. Vittorio A. D'Onofrio

Validazione

aprile 2022



Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI BENEVENTO

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI

LOTTO N. ____ : CIG _____ – CUP _____

VISTI:

- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;

Tutto ciò premesso:

L’anno duemilaventidue (2022) addì ____ del mese di _____, in Benevento, presso la Segreteria Generale della Provincia di Benevento, sito in Piazza Castello, 82100 Benevento, dinanzi a me Dott.ssa Maria Luisa Dovetto, Segretario Generale della Provincia di Benevento, come da Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. del, autorizzato a rogare i contratti di cui l’Ente è parte, sono comparsi:

Ing. _____, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento;

Sig. _____, nato a ____ il ____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ e quindi legale rappresentante dell’Operatore Economico Aggiudicatario _____ con sede legale in ____, Via _____ (CAP _____) CF/Partita IVA e numero iscrizione nel Registro delle imprese di _____ in seguito l’“Operatore Economico”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. ____ in data _____, esecutiva, la Stazione Appaltante ha stabilito di concludere idoneo Accordo Quadro per l’esecuzione L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI ex art. 54 del D.lgs 50/2016 (in seguito

denominato "Codice") del complessivo importo presunto massimo di €....., di cui € per oneri della sicurezza, ed ha disposto di individuare il contraente con procedura ai sensi dell'art. ____, comma ____ del Codice da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- b) con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice, l'accordo quadro per l'esecuzione dei suddetti Servizi e lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'Operatore Economico _____ con sede legale in _____ Via _____, offerente il ribasso d'asta unico del _____ % da applicarsi sia sulla tariffa per determinare il compenso professionale per l'espletamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sia sull'elenco prezzi utilizzato per determinare il costo dei servizi e lavori accessori, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera. La stipula del presente Accordo Quadro consente al Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento di stipulare Contratti Attuativi, secondo le modalità e le procedure previste nel Capitolato Speciale di Appalto, fino alla concorrenza di un importo massimo di euro ____ (euro) oltre IVA come per legge;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice, l'aggiudicazione disposta con atto n. ____ del __ è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice;
- d) per la suddetta gara sono state effettuate dal Servizio responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- e) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. ____ /' ____ (anno) – con fondi _____;
- f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- g) in data _____ sono stati forniti dall'Operatore Economico i dati e le notizie previste dal D.P.C.M. n. 187/1991 (tutte le imprese del R.T.I.; in caso di Consorzio: sia Consorzio che impresa esecutrice);
- h) il RUP ha disposto in via di urgenza la consegna dei lavori anticipatamente alla stipula del contratto, come da verbale di consegna in data, sottoscritto dall'Operatore Economico, così come consentito dell'art 32 comma 8 del Codice (per motivi di URGENZA)
- i) ai sensi dell'art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite dagli operatori economici costituenti il R.T.I., nella seguente percentuale:

O.E.

O.E.

l) l'Operatore Economico ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per i Servizi riconducibili alla Categoria _____ e per le lavorazioni riconducibili alla Categoria _____;

OPPURE

m) l'Operatore Economico ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;

n) trattandosi di un appalto con prevalenza di Servizi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi interferenti);

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, l'Ing.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo quadro e valore stimato

La Stazione Appaltante affida all'Operatore Economico, che accetta, l'esecuzione del SERVIZIO di Architettura e Ingegneria con connessi servizi e lavori accessori di supporto alla progettazione per la VERIFICA ACCURATA dei Ponti Esistenti di competenza della Provincia di Benevento, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nella forma di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi attuativi di attivazione del Servizio saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante. Con la stipula del singolo Contratto Attuativo viene stabilito il compenso a corpo da corrispondere all'Aggiudicatario. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in complessivi € _____, oltre IVA nella misura di legge.

Il valore dei contratti attuativi verrà determinato applicando l'unico ribasso offerto da applicarsi sia sulla tariffa per determinare il compenso professionale per l'espletamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sia sull'elenco prezzi utilizzato per determinare il costo dei servizi e lavori accessori, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. =====

L'aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso. =====

Gli interventi che formano oggetto del presente accordo quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dall'Ufficio del Direttore dell'Esecuzione alla consegna dei lavori, nell'art.

___ del Capitolato Speciale che l'Operatore Economico dichiara di conoscere ed accettare.

I lavori saranno valutati con le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale e più precisamente all'art.

_____.

ARTICOLO 4 - Sede operativa

L'Operatore Economico, così come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e più precisamente dall'art. ___, ha istituito la propria sede operativa in

ARTICOLO 5 - Durata

L'accordo quadro avrà la durata fino alla data del _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione o di consegna anticipata in via d'urgenza avvenuta in data ___ e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei lavori affidabili di cui al precedente art. 3.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l'Operatore Economico nel caso in cui vi siano Servizi in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte entro il _____ e comunque entro tempi compatibili per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione che dovrà essere emesso in tempi utili per consentire la rendicontazione dell'intervento eseguito entro il 31/12/2022, al fine di poter rendicontare le spese al MIMS – Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibile.

ARTICOLO 7 - Contratti attuativi e procedura di affidamento

Il Dirigente di Settore sulla scorta degli studi e le analisi preliminari in corso di esecuzione sui Ponti che fanno parte della rete Stradale della Provincia di Benevento indicherà l'esigenza di attivare il Servizio di VERIFICA ACCURATA su uno specifico Ponte Esistente.

All'Operatore Economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro per il lotto in cui risulti compresa l'opera individuata saranno affidati i Servizi oggetto del presente Accordo mediante formulazione di una richiesta scritta denominata "Ordine di Lavoro" (ODL).

L'ODL prevede inizialmente che l'O.E. sia convocato per l'esecuzione di un sopralluogo preliminare (secondo la nota tipo n.1 allegata di seguito) a seguito del quale, entro i 10 giorni successivi a far data dallo stesso, dovrà trasmettere il Piano della Campagna di Indagini con allegato computo estimativo.

Il sopralluogo sarà necessario alla S.A. ai fini della determinazione del compenso spettante all'O.E. per la prestazione professionale della Verifica Accurata, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto; inoltre, la S.A., ricevuto il Piano della Campagna di Indagini e relativo computo, ne valuterà la congruità e, in caso di esito positivo, procederà alla convocazione dell'O.E. per la stipula del Contratto Attuativo (secondo la nota tipo n.3 allegata di seguito).

Al Contratto suddetto, nel quale sarà riportato, evidentemente, il Quadro Economico di progetto redatto al netto del ribasso d'asta offerto dall'O.E. aggiudicatario, saranno allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria con individuazione del Ponte Esistente in gestione della Provincia di Benevento per il quale viene assegnato l'incarico di eseguire la Verifica Accurata e le attività elencate all'articolo 3 del Capitolato;
- b) Verbale di sopralluogo preliminare eseguito sul Ponte Esistente, redatto congiuntamente tra il rappresentante legale dell'Operatore Economico e il Direttore dell'Esecuzione e il RUP, nel quale è stata individuata la superficie del Ponte Esistente oggetto dell'incarico (verbale redatto come da nota tipo n.2 allegata di seguito);
- c) Documento costituente il calcolo del compenso lordo per la prestazione professionale richiesta, redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016, ed in accordo con quanto stabilito all'articolo 14 del presente Capitolato oltre che con quanto previsto nell'elaborato R5 – Calcolo parcella tipo – del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il compenso al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Operatore Economico;
- d) Documento costituente approvazione del Piano della Campagna di indagini e prove in sito, delle prove certificate da eseguire in Laboratorio, dei lavori per indagini geologiche e geotecniche da eseguire in sito, con calcolo del relativo costo al lordo del ribasso, in accordo con quanto stabilito all'articolo 15 del presente Capitolato - Modalità di determinazione del costo per esecuzione delle prove ed indagini sulla struttura – e con quanto stabilito nell'elaborato R4 - Elenco prezzi unitari per esecuzione prove in sito – del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il costo della campagna di indagini al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Operatore Economico
- e) Relazione descrittiva di sintesi dell'intervento da eseguire, con la quale viene stabilito l'importo di affidamento, la data di inizio ed il termine massimo di ultimazione dell'intervento.

Sulla scorta dell'Ordine di Lavoro ricevuto viene sottoscritto il Contratto Attuativo che viene sottoscritto dal Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture e dal legale rappresentante dell'Aggiudicatario ed acquisito al protocollo dell'Ente. Nel Contratto, in particolare, sarà compiutamente definito l'intervento da eseguire nonché il relativo importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

A seguito dell'espletamento del Servizio di VERIFICA ACCURATA, in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, e ad esito delle risultanze delle verifiche eseguite, sarà possibile sottoscrivere ulteriore Contratto Attuativo per l'attivazione del Servizio per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi strutturali da eseguire ed, eventualmente, anche ulteriore Contratto Attuativo per la redazione del Progetto Esecutivo degli interventi strutturali per l'adeguamento e/o il miglioramento e/o la riparazione locale delle strutture del Ponte analizzato.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all'interno del relativo Contratto Attuativo:

- Accordo quadro;
- Elenco prezzi;
- Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- Offerta economica;
- POS.

ARTICOLO 8 - Fatturazione e pagamento

La contabilizzazione dei singoli Contratti Attuativi sarà effettuata a corpo, in contraddittorio tra l'Operatore Economico e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Stazione Appaltante, sulla base di quanto previsto e stabilito nei singoli Contratti Attuativi.

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente Contratto sarà effettuato all'Operatore Economico a conclusione di ogni singola prestazione prevista dal singolo Contratto Attuativo, con le modalità indicate all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva. E' ammessa l'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva dell'Operatore Economico e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 comma 5 e comma 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

ARTICOLO 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del _____ con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40/2008. Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

ARTICOLO 10 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Operatore Economico potrà subappaltare l'attività/le attività _____, indicata/e nella dichiarazione del _____, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. ____.

- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);

- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (in modo particolare agli artt. ____) nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Operatore Economico di recedere dal contratto.

In particolare, poi, si rammenta che per le prestazioni relative a Servizi di Architettura e Ingegneria è ammesso il subappalto esclusivamente delle attività previste all'articolo 31 comma 8 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 11 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, l'Operatore Economico ha costituito la garanzia fideiussoria di € ____ (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n.____ rilasciata dalla Compagnia____, Agenzia n.____, in data _____,

OPPURE

mediante fideiussione bancaria rilasciata dall'Istituto di Credito____, Agenzia n.____, in data_____, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

L'Operatore Economico assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione Appaltante

(SE I LAVORI NON SONO STATI CONSEGNATI E LA POLIZZA NON E' ANCORA STATA PRESENTATA);

a tal fine provvederà a costituire apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice, nonché dell'art.____del Capitolato Speciale d'Appalto.

OPPURE

(SE I LAVORI SONO STATI CONSEGNATI ED E' STATA PRESENTATA UNA POLIZZA ASS.VA AL RUP);

le parti danno atto che ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 12 – Norme regolatrici

L'Operatore Economico si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 13 – Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Benevento.

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico dell'Operatore Economico sono state versate alla Tesoreria della Provincia di Benevento con bonifico del _____.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € _____ (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI. L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto e sul cronoprogramma è stata assolta tramite contrassegno telematico n..

ARTICOLO 15 - Codici di comportamento

L'Operatore Economico dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Benevento che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Provincia di Benevento, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. del, è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.....>

ARTICOLO 16 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l'Operatore Economico che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 17 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Documentazione di progetto costituita da:

R0 – ELENCO ELABORATI

R1 – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

R2 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

R3 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI) – PRIME INDICAZIONI

R4 – ELENCO PREZZI UNITARI PER ESECUZIONE PROVE IN SITO

R5 – CALCOLO DELLA PARCELLA TIPO PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE

R6 – SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO – SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI – SCHEMA ORDINE DI LAVORO: NOTA TIPO N. 1; N.2; N.3.

R7 – COROGRAFIA ED ELENCO STRADE DEL LOTTO DI INTERVENTO N. 1

R8 – COROGRAFIA ED ELENCO STRADE DEL LOTTO DI INTERVENTO N. 2

R9 – COROGRAFIA ED ELENCO STRADE DEL LOTTO DI INTERVENTO N. 3

R10 – COROGRAFIA ED ELENCO STRADE DEL LOTTO DI INTERVENTO N. 4

R11 – COROGRAFIA ED ELENCO STRADE DEL LOTTO DI INTERVENTO N. 5

R12 – SCHEMA BANDO DI GARA E SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

R13 – INCIDENZA MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI – COSTI DELLA SICUREZZA.

Cauzione; (cartacea o in digitale se abbiamo un file)

Offerta Economica dell'“Operatore Economico”.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _lettere_() pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Provincia di Benevento: F.to _____

Per l'Operatore Economico _____: F.to ____

Il Segretario Generale: F.to _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Operatore Economico dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 8, 9, 12 e 14 del presente contratto.



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Largo G. Carducci n° 5 – 82100 Benevento
asetore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

PROT. _____

DEL _____

SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE. INTERVENTO DEL LOTTO N. _____ ORDINE DI LAVORO N. _____ AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA VERIFICA ACCURATA DA ESEGUIRE PER IL PONTE DENOMINATO “ _____ ”

NOTA TIPO N. 1 – CONVOCAZIONE PER SOPRALLUOGO PRELIMINARE

PREMESSO:

- che con Accordo Quadro di cui in oggetto, sottoscritto in data ____ con rep. del_ il Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento ha affidato all’Operatore Economico l’esecuzione degli interventi e delle prestazioni relativi al Servizio di Ingegneria per la Verifica Accurata ed eventuale connessa Progettazione;
- che ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’Operatore Economico si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d’asta offerto in sede di gara;

CONSIDERATO CHE:

- il Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento ha in corso l’approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento, sulla scorta delle attività di ispezione e controllo finora svolte e tuttora in essere, ha evidenziato la necessità di svolgere la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato “ _____ ”.
Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di lungo la Strada Provinciale n. _____ al Km _____ e quindi nel Lotto _____ dell’Accordo Quadro di cui in oggetto;
- che alla data attuale, nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui in oggetto sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:

- 1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro _____ ;
- 2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Largo G. Carducci n° 5 – 82100 Benevento
asetore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

e somme a disposizione) pari ad euro _____ ;

e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro _____ (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari alla somma residua di euro (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione);

Tutto ciò premesso, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, SI COMUNICA che:

Codesto Operatore Economico è convocato in data alle ore sulla Strada Provinciale n. al Km nel Comune di al fine di eseguire le seguenti attività:

- a) Eseguire Sopralluogo Preliminare relativamente al Ponte in oggetto, alla presenza dell'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto e del RUP, sui luoghi indicati, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari affinché l'Operatore Economico possa redigere il Programma Dettagliato delle prove e delle indagini come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto entro i successivi 10 giorni dal sopralluogo;
- b) In occasione del Sopralluogo sarà redatto apposito Verbale da sottoscrivere tra le parti;

Nel caso di indisponibilità all'esecuzione del sopralluogo saranno applicate le penali di cui all'art..... del Capitolato Speciale di Appalto.

La presente convocazione si configura come atto formale con il quale il Dirigente di Settore dispone l'attivazione del Servizio di Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato "_____".

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente di Settore



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Largo G. Carducci n° 5 – 82100 Benevento
asetore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

PROT. _____

DEL _____

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE. INTERVENTO DEL LOTTO N. _____ ORDINE DI LAVORO N. _____ AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA VERIFICA ACCURATA DA ESEGUIRE PER IL PONTE DENOMINATO “ _____ ”

NOTA TIPO N. 2 – VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Premesso che:

- che con Accordo Quadro di cui in oggetto, sottoscritto in data _____ con rep. del _____ il _____ Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento ha affidato all’Operatore Economico l’esecuzione degli interventi e delle prestazioni relativi al Servizio di Ingegneria per la Verifica Accurata ed eventuale connessa Progettazione - INTERVENTO LOTTO N. _____;
- ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’Operatore Economico si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d’asta offerto in sede di gara;
- il Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento ha in corso l’approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento, sulla scorta del livello di conoscenza fin ora raggiunto ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato “ _____ ”;
- Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di lungo la Strada Provinciale n _____ al Km..... e rientra quindi nel Lotto 1 dell’Accordo Quadro di cui in oggetto;
- Il Dirigente del Settore ha, pertanto, disposto l’attivazione del Servizio di Verifica Accurata di cui in oggetto sul Ponte Esistente descritto in precedenza;
- con nota avente prot. del è stata attivata la procedura per la stipula del Contratto attuativo per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, convocando sopralluogo in corrispondenza del predetto Ponte, per il giorno alle ore

Tutto ciò premesso

L’anno 2022 il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____

PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Largo G. Carducci n° 5 – 82100 Benevento
asetore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

In merito poi alle dimensioni del Ponte Esistente da analizzare si rileva che le dimensioni in pianta del Ponte sono le seguenti:

LUNGHEZZA [m]	LARGHEZZA [m]	SUPERFICIE [mq]

Tali misurazioni saranno utili al fine di determinare il compenso spettante per la prestazione professionale della Verifica Accurata secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli Elaborati di progetto posti a base di gara.

Si rammenta che entro 10 (dieci) giorni a far data dal presente sopralluogo l'Operatore Economico dovrà trasmettere il Piano della Campagna di Indagini con allegato il Computo Estimativo che ne determina il costo al RUP e al DEC del Servizio.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Dirigente del Settore per i successivi provvedimenti consequenziali. Si allegano gli atti citati e documentazione fotografica

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore ____.

PER L'OPERATORE ECONOMICO

_____ firma _____
_____ firma _____
_____ firma _____

PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO

D.E.C. firma _____

RUP. firma _____

VISTO: IL DIRIGENTE

firma _____

PROT. _____

DEL _____

SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE. INTERVENTO DEL LOTTO N. _____ ORDINE DI LAVORO N. _____ AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA VERIFICA ACCURATA DA ESEGUIRE PER IL PONTE DENOMINATO “_____”

NOTA TIPO N. 3 – CONVOCAZIONE PER STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO

Premesso che:

- che con Accordo Quadro di cui in oggetto, sottoscritto in data ____ con rep. del_ il Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento ha affidato all’Operatore Economico l’esecuzione degli interventi e delle prestazioni relativi al Servizio di Ingegneria per la Verifica Accurata ed eventuale connessa Progettazione - INTERVENTO LOTTO N. _____;
- ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’Operatore Economico si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d’asta offerto in sede di gara;
- il Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento ha in corso l’approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento, sulla scorta del livello di conoscenza fin ora raggiunto ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato “_____”. Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di _____ lungo la Strada Provinciale n..... al Km _____ e rientra nel Lotto n. __ dell’Accordo Quadro di cui in oggetto;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture ha, pertanto, disposto l’attivazione del Servizio di Verifica Accurata di cui in oggetto sul Ponte Esistente descritto in precedenza;
- con nota avente prot. del è stata attivata la procedura per la stipula del Contratto attuativo per l’attivazione del Servizio di Verifica Accurata del Ponte Esistente di cui trattasi, convocando sopralluogo in corrispondenza del predetto Ponte, per il giorno
- in data è stato eseguito il Sopralluogo sulle aree di cui trattasi al quale hanno partecipato l’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del Contratto, il RUP e

l'Operatore Economico..... ed in tale sede è stato redatto il Verbale di Sopralluogo avente prot. del

In tale sede è stato indicato all'Operatore Economico di trasmettere il Programma delle Prove e delle indagini entro i successivi 10 giorni ed è stato accertato che le dimensioni in pianta del Ponte sono – Lunghezza L = Larghezza B = - Superficie = mq;

- L'Operatore Economico ha trasmesso il Programma delle Prove e delle Indagini unitamente al relativo Computo Metrico Estimativo, acquisito al prot. del _____, che riporta un costo complessivo al lordo per l'esecuzione delle prove pari ad euro e quindi applicando il ribasso d'asta del %, si determina un costo complessivo delle prove al netto del ribasso d'asta pari ad euro _____ oltre IVA come per legge;
- Avendo nel sopralluogo preliminare rilevato **le dimensioni in pianta del Ponte Esistente da analizzare, è stato determinato il compenso spettante per la prestazione professionale della Verifica Accurata (secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli Elaborati di progetto posti a base di gara); applicato a tale corrispettivo** il ribasso d'asta del %, si determina un costo complessivo della prestazione professionale al netto del ribasso d'asta pari ad euro _____ oltre IVA come per legge;
- l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento hanno analizzato il Programma delle Prove e delle Indagini, ritenendolo congruo;

CONSIDERATO CHE alla data attuale, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui in oggetto sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:

- 1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro
- 2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro

e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione)

e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari alla somma residua di euro (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione);

Tutto ciò premesso, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, SI COMUNICA che:

Codesto Operatore Economico è convocato in data _____ alle ore _____ presso la sede della Provincia di Benevento, al fine di eseguire le seguenti attività:

- a) **Sottoscrivere il Contratto Attuativo** per l'espletamento della prestazione del Servizio di Architettura ed Ingegneria per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, il cui costo complessivo al netto del ribasso d'asta è pari ad euro, composto dalle seguenti voci di prezzo al netto del ribasso d'asta:
 - a1) Prestazione Professionale = euro..... (Parcella Professionale ribassata);
 - a2) Prove ed indagini in sito = euro..... (Costo al netto del ribasso d'asta)
 - a3) Lavori di indagini geognostiche = euro..... (Costo al netto del ribasso d'asta)

b) Il Costo dell'intervento è desumibile anche dal Quadro Economico dell'intervento che si

allega di seguito:

QUADRO ECONOMICO - Interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti lungo la viabilità provinciale - LOTTO n. ____ (codice _____.V1.BN)		
A) IMPORTO SERVIZI E LAVORI		
A.1) Importo massimo pagabile all'operatore economico per il Servizio di Ingegneria - Verifica accurata della sicurezza e/o Progetto di fattibilità tecnica ed economica - oneri della sicurezza aziendali inclusi	- €	
A.2) Indagini strutturali quali prove sui materiali, rilievi geometri, opere per accesso aree, taglio vegetazione, rilievi topografici, prove di carico e campagna di Indagini geologiche e quanto altro occorra per dare finito il servizio a regola d'arte e secondo le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto - oneri della sicurezza aziendali inclusi		
A.3) Ribasso offerto del ____%	- €	
A.4) Restano [(A.1+A.2) - A.3]	- €	
A.5) Costi presunti della sicurezza non soggetti a ribasso	- €	
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.4+A.5)		- €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Spese Tecniche per RUP e D.E.C. [max 2% A]	- €	
B.2) Imprevisti e lavori in economia (iva inclusa)	- €	
B.3) Spese per attività di consulenza e supporto tecnico - Oneri amministrativi	- €	
B.4) CNPAIA 4% di [A.1]	- €	
B.5) IVA Servizi + Lavori (22%) di [A+B.4]	- €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		- €
TOTALE GENERALE (A+B)		- €

Nel caso di indisponibilità alla sottoscrizione del Contratto Attuativo saranno applicate le penali di cui all'art. ____ del Capitolato Speciale di Appalto.

Il Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente di Settore

PROT. _____

DEL _____

Codice CIG: _____

Codice CUP: _____

Commessa: _____

CONTRATTO ATTUATIVO Rif. N. _____

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE. LOTTO N° _____
ORDINE DI LAVORO n. _____ AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA VERIFICA ACCURATA DA ESEGUIRE PER IL PONTE DENOMINATO “ _____ ”**

TRA

Ing. _____, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento;

E

Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ e quindi legale rappresentante, dell’Operatore Economico _____ con sede legale in _____, Via _____ (CAP _____) CF/Partita IVA e numero iscrizione nel Registro delle imprese di _____ in seguito l’“Operatore Economico”

PREMESSO:

- che con Accordo Quadro sottoscritto in data _____ con rep. del _____ il _____ Committente ha affidato all’Operatore Economico l’esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di “**ACCORDO QUADRO per l’esecuzione del SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE. LOTTO N° _____, CIG _____, CUP _____**”
- che ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’Operatore Economico si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d’asta unico offerto pari a _____ %, da applicarsi sia sulla tariffa per determinare il compenso professionale per l’espletamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sia

sull'elenco prezzi utilizzato per determinare il costo dei servizi e lavori accessori, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera. La stipula del predetto Accordo Quadro consente al Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento di stipulare Contratti Attuativi, secondo le modalità e le procedure previste nel Capitolato Speciale di Appalto, fino alla concorrenza di un importo massimo di euro ____ (euro _____) oltre IVA come per legge;

- il Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento ha in corso l'approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento, sulla scorta del livello di conoscenza fin ora raggiunto ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato “_____”. Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di lungo la Strada Provinciale n. _____ al Km e rientra nel Lotto n. ___ dell'Accordo Quadro di cui in oggetto;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture ha, pertanto, disposto l'attivazione del Servizio di Verifica Accurata di cui in oggetto sul Ponte Esistente descritto in precedenza;
- con nota avente prot. del è stata attivata la procedura per la stipula del Contratto attuativo per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, convocando sopralluogo in corrispondenza del predetto Ponte, per il giorno
- in data _____ è stato eseguito il Sopralluogo sulle aree di cui trattasi al quale hanno partecipato l'Ufficio Direzione dell'Esecuzione del Contratto, il RUP e l'Operatore Economico ed in tale sede è stato redatto il Verbale di Sopralluogo avente prot. del In tale sede è stato indicato all'Operatore Economico di trasmettere il Programma delle Prove e delle indagini entro i successivi 10 giorni ed è stato accertato che le dimensioni in pianta del Ponte sono – Lunghezza L = Larghezza B = - Superficie = mq;
- L'Operatore Economico ha trasmesso il Programma delle Prove e delle Indagini unitamente al relativo Computo Metrico Estimativo, acquisito al prot. del _____, che riporta un costo complessivo al lordo per l'esecuzione delle prove pari ad euro _____ e quindi applicando il ribasso d'asta del __%, si determina un costo complessivo al netto del ribasso d'asta pari ad euro ___ oltre IVA come per legge;
- l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento hanno analizzato il Programma delle Prove e delle Indagini, ritenendolo congruo;
- l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento viste le dimensioni del Ponte Esistente hanno anche determinato il compenso professionale ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto e sulla scorta degli Elaborati di progetto

posti a base di gara;

- con nota avente prot. del l'Operatore Economico è stato invitato a sottoscrivere il presente Contratto Attuativo, indicando che per l'espletamento della prestazione del Servizio di Architettura ed Ingegneria per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, il costo complessivo determinato al netto del ribasso d'asta è pari ad euro ____, composto dalle seguenti voci di:

prezzo al netto del ribasso d'asta:

a1) Prestazione Professionale = euro ____ (Parcella Professionale ribassata);

a2) Prove ed indagini in sito = euro ____ (Costo al netto del ribasso d'asta)

a3) Lavori di indagini geognostiche = euro ____ (Costo al netto del ribasso d'asta)

- Il Costo dell'intervento è desumibile anche dal Quadro Economico dell'intervento che si allega di seguito:

QUADRO ECONOMICO - Interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti lungo la viabilità provinciale - LOTTO n. ____ (codice _____.V1.BN)		
A) IMPORTO SERVIZI E LAVORI		
A.1) Importo massimo pagabile all'operatore economico per il Servizio di Ingegneria - Verifica accurata della sicurezza e/o Progetto di fattibilità tecnica ed economica - oneri della sicurezza aziendali inclusi	- €	
A.2) Indagini strutturali quali prove sui materiali, rilievi geometri, opere per accesso aree, taglio vegetazione, rilievi topografici, prove di carico e campagna di Indagini geologiche e quanto altro occorra per dare finito il servizio a regola d'arte e secondo le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto - oneri della sicurezza aziendali inclusi		
A.3) Ribasso offerto del ____%	- €	
A.4) Restano [(A.1+A.2) - A.3]	- €	
A.5) Costi presunti della sicurezza non soggetti a ribasso	- €	
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.4+A.5)		€ -
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Spese Tecniche per RUP e D.E.C. [max 2% A]	- €	
B.2) Imprevisti e lavori in economia (iva inclusa)	- €	
B.3) Spese per attività di consulenza e supporto tecnico - Oneri amministrativi	- €	
B.4) CNPAIA 4% di [A.1]	- €	
B.5) IVA Servizi + Lavori (22%) di [A+B.4]	- €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ -
TOTALE GENERALE (A+B)		€ -

CONSIDERATO CHE

- il Committente intende, quindi, affidare all'Operatore Economico la realizzazione dell'esecuzione dell'intervento di cui all'Ordine di Lavoro n. per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato "....." per l'importo di euro (oltre Iva e somme a disposizione). Il costo complessivo stimato dell'intervento è pari ad euro _____ (comprensivo di lavori, IVA e somme a disposizione);
- che alla data attuale sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:
 - a) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro _____ ;
 - b) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro _____ ;e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro _____ (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari alla somma residua di euro _____ (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione);
- pertanto, la somma necessaria per la stipula del presente Contratto attuativo pari ad euro _____ (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) trova capienza nelle somme residue di cui alla disponibilità originaria dell'Accordo Quadro;

Tutto ciò premesso il Committente e l'Operatore Economico (di seguito congiuntamente indicati anche come "Parti") convengono quanto segue.

Art. 1. Disciplina del Contratto Attuativo

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal medesimo Accordo Quadro.

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo

Il committente affida all'Operatore Economico l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la realizzazione del Servizio di VERIFICA ACCURATA del PONTE ESISTENTE denominato " _____ " secondo le seguenti documentazioni che si allegano al presente Contratto Attuativo

- 1) Planimetria con individuazione del Ponte Esistente in gestione della Provincia di Benevento per il quale viene assegnato l'incarico di eseguire la Verifica Accurata e le attività elencate all'articolo 4 del presente Capitolato;
- 2) Verbale di sopralluogo preliminare eseguito sul Ponte Esistente, redatto congiuntamente tra il rappresentante legale dell'Operatore Economico e il Direttore dell'Esecuzione e il RUP, nel

quale è stata individuata la superficie del Ponte Esistente oggetto dell'incarico;

- 3) Documento costituente il calcolo del compenso lordo per la prestazione professionale richiesta, redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016, ed in accordo con quanto stabilito all'articolo 14 del presente Capitolato oltre che con quanto previsto nell'elaborato R5 – Calcolo parcella tipo – del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il compenso al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Operatore Economico;
- 4) Documento costituente approvazione del Piano della Campagna di indagini e prove in sito, delle prove certificate da eseguire in Laboratorio, dei lavori per indagini geologiche e geotecniche da eseguire in sito, con calcolo del relativo costo al lordo del ribasso, in accordo con quanto stabilito all'articolo 15 del presente Capitolato - Modalità di determinazione del costo per esecuzione delle prove ed indagini sulla struttura – e con quanto stabilito nell'elaborato R4 - Elenco prezzi unitari per esecuzione prove in sito – del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il costo della campagna di indagini al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Operatore Economico
- 5) Relazione descrittiva di sintesi dell'intervento da eseguire, con la quale viene stabilito l'importo di affidamento, la data di inizio ed il termine massimo di ultimazione dell'intervento.

che allegati al presente Contratto Attuativo, definiscono l'intervento da espletare.

Art. 3. Termini

Il termine ultimo per l'ultimazione dell'intervento di cui trattasi è fissato in n. _____giorni dal verbale di consegna dei lavori.

Art. 4. Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall'Operatore Economico con il presente Contratto Attuativo è stabilito nella somma onnicomprensiva per l'esecuzione del Servizio e delle indagini e prove accessorie (IVA esclusa) di € __,__(_/00) di cui € __,__(_/00) per gli oneri della sicurezza;

Pertanto il costo complessivo per l'esecuzione dell'intervento è pari ad euro (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) come da quadro economico di progetto dell'intervento allegato in precedenza, sul quale è stato applicato il ribasso d'asta offerto dall'Operatore Economico.

Il corrispettivo così determinato deve intendersi pienamente remunerativo per l'intervento da eseguire, ed è comprensivo di tutti gli oneri e compensi per mano d'opera correlati all'esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto Attuativo, incluse le lavorazioni su più turni che l'Operatore Economico dovrà sostenere per consegnare le opere commissionate complete ed ultimate, nel rispetto dei termini fissati. Resta naturalmente inteso che il

corrispettivo su indicato è fisso e invariabile e che non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 1664 cod. civ..

Il corrispettivo si intende fissato a corpo e sarà corrisposto dopo l'espletamento della verifica di conformità da parte del RUP e del Direttore dell'Esecuzione

Art. 5. Modalità di pagamento

Il corrispettivo di spettanza dell'Operatore Economico sarà pagato dal Committente con le modalità e nei termini previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato speciale.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi maturati dall'Operatore Economico, quest'ultimo avrà diritto al pagamento dei soli interessi legali, senza maggiorazione alcuna.

Art. 6 Cessione del credito

L'Operatore Economico non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Art. 7. Divieto di cessione

È fatto espresso divieto all'Operatore Economico di cedere in tutto o in parte il presente Contratto Attuativo. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto Attuativo e dell'Accordo quadro. L'eventuale subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo sarà consentito nei limiti ed in presenza delle condizioni previste dalla vigente normativa e secondo quanto definito nel Capitolato speciale di Appalto.

Art. 8. Recesso

Il Committente, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà recedere dal presente Contratto Attuativo. Il recesso avrà effetto dal giorno in cui verrà comunicato all'Operatore Economico mediante comunicazione a mezzo pec. In tal caso l'Operatore Economico avrà diritto al pagamento delle sole attività eseguite sino a quel momento.

Art. 9. Penali

In caso di ritardo dell'Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni commissionate con il presente Contratto Attuativo e/o di inesatto adempimento delle stesse, troveranno applicazione le penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. L'importo delle penali verrà direttamente ritenuto sui corrispettivi maturati dall'Operatore Economico. Resta, comunque, salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Art. 10. Perfezionamento del Contratto Attuativo

Il presente Contratto Attuativo si perfeziona al momento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico e del Dirigente di Settore, con acquisizione del presente Contratto Attuativo al protocollo dell'Ente.

In caso di ritardi nella sottoscrizione del Contratto Attuativo, troveranno applicazione le penali previste nel Capitolato speciale di Appalto. Anche in tale ipotesi resta comunque salvo il diritto del committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Art. 11. Foro Competente

Ogni controversia inerente l'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Benevento.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Operatore Economico dichiara di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 5: modalità di pagamento 6: cessione dei crediti 7: Divieto di cessione del contratto 8: Recesso 9: Penali 11: Foro competente

BENEVENTO, li

L'Operatore Economico

Il Dirigente di Settore
